Bauzeitenplan

45355 Essen, Schnurstr. 8-20 **Verantwortliche Bauleitung: Marc Lindenberg** **Erstausstellung: 08.01.2020**
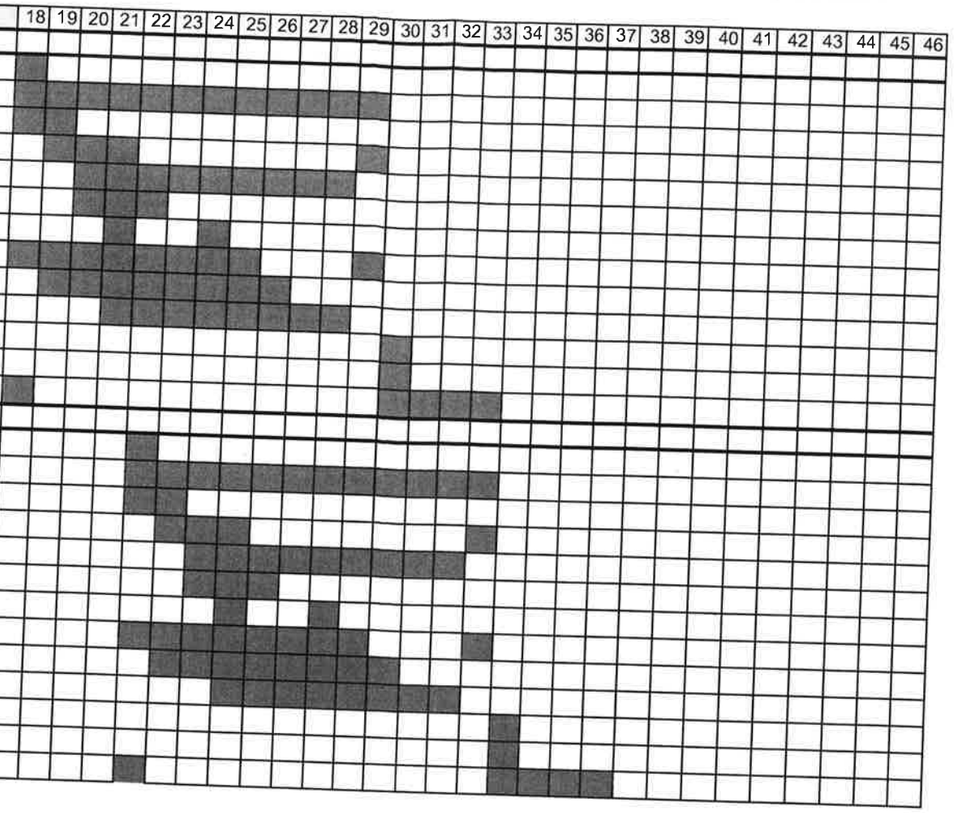
2020 KW		
Schnurstr. 14 - 20	**Gesamtzeitraum**	
Baustelleneinrichtung (WDVS)	Baustelleneinrichtung	**KW 18 bis KW 33**
Gerüstbau für WDVS und Dacherneuerung	Gerüstbau und -standzeit	
Fenstereinbau	Ausbau der alten Elemente und Einbau Kunststofffenster	
Erneuerung Dachfläche	Demontage Fallrohre und Rinnen, Abbruch Dachfläche, Erneuerung Dachfläche, Montage Fallrohre	
Wärmedämmfassade und Anstricharbeiten	Reinigung Fassade, Abklebearbeiten, Dämmung, Armierung, Putz, Anstrich	
Kellerdeckendämmung	Dämmung der Kellerdecken und anpassen der Keller-Lattenverschläge	
Eingangspodeste erneuern	Abbruch der alten Podeste und Einbau neuer Natursteinpodeste	
Elektroarbeiten	Steckdosen auf Balkon für WDVS vorbereiten, Zählerzentralisierung, WM-Stellplätze, Beleuchtung	
WE-Türen und FH-Türen	Demontage und Montage WE-Türen und FH-Türen Keller und Speicher	
Treppenhausanstrich	E-Schlitze und Zählernischen schliessen, Fensterbänke im TH Naturstein, Floc-Beschichtung, Lackierarbeiten	
Vordächer	Montage von Vordächern	
Briefkastenanlagen	Montage von freistehenden Briefkastenanlagen	
Gartenbauarbeiten	Gehölzrodung, Wege und Treppen erneuern, Bepflanzung, Traufstreifen Bruchstein umlaufend	
Schnurstr. 8 - 12	**Gesamtzeitraum**	
Baustelleneinrichtung (WDVS)	Baustelleneinrichtung	**KW 22 bis KW 37**
Gerüstbau für WDVS und Dacherneuerung	Gerüstbau und -standzeit	
Fenstereinbau	Ausbau der alten Elemente und Einbau Kunststofffenster	
Erneuerung Dachfläche	Demontage Fallrohre und Rinnen, Abbruch Dachfläche, Erneuerung Dachfläche, Montage Fallrohre	
Wärmedämmfassade und Anstricharbeiten	Reinigung Fassade, Abklebearbeiten, Dämmung, Armierung, Putz, Anstrich	
Kellerdeckendämmung	Dämmung der Kellerdecken und anpassen der Keller-Lattenverschläge	
Eingangspodeste erneuern	Abbruch der alten Podeste und Einbau neuer Natursteinpodeste	
Elektroarbeiten	Steckdosen auf Balkon für WDVS vorbereiten, Zählerzentralisierung, WM-Stellplätze, Beleuchtung	
WE-Türen und FH-Türen	Demontage und Montage WE-Türen und FH-Türen Keller und Speicher	
Treppenhausanstrich	E-Schlitze und Zählernischen schliessen, Fensterbänke im TH Naturstein, Floc-Beschichtung, Lackierarbeiten	
Vordächer	Montage von Vordächern	
Briefkastenanlagen	Montage von freistehenden Briefkastenanlagen	
Gartenbauarbeiten	Gehölzrodung, Wege und Treppen erneuern, Bepflanzung, Traufstreifen Bruchstein umlaufend
